



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第8讲 项目资源与沟通管理

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

1. 项目资源管理

项目资源管理

PMBOK指南第五版		PMBOK指南第六版	
9.1	规划人力资源管理	9.1	规划资源管理
9.2	组建项目团队	9.2	估算活动资源
9.3	建设项目团队	9.3	组建资源
9.4	管理项目团队	9.4	建设团队
		9.5	管理团队
		9.6	控制资源

- 扩大了本章范围，从先前重点关注人力资源到如今包含所有资源；
- 为了区分人力资源和其他资源，术语“团队资源(team resources)”用于指代人力资源，术语“物质资源(physical resources)”用于指代其他资源；

项目资源管理

- **9.1 规划资源管理** — 定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源的过程。
- 9.2 估算活动资源** — 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。
- 9.3 获取资源** — 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。
- 9.4 建设团队** — 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。
- 9.5 管理团队** — 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。
- 9.6 控制资源** — 确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。

人事管理与人力资源管理

	人事管理	人力资源管理
管理重点	<u>以事为核心</u>	<u>以人为核心</u>
管理活动	<u>被动反应型</u>	<u>主动开发型</u>
管理内容	<u>内容比较窄</u>	<u>内容比较宽</u>
管理方式	<u>孤立的、静止的</u>	<u>整体的、动态的</u>

古典的人事管理理论

- 泰罗的人事管理理论
- 法约尔的人事管理理论
- 韦伯的人事管理理论

泰罗的人事管理理论

- 科学地确定劳动定额
- 挑选与岗位技能要求相符的工人
- 实行刺激性的差别计件工资制
- 科学地培训工人
- 倡导劳资双方合作
- 实行专业职能管理，将脑力劳动与体力劳动分开

法约尔的人事管理理论

- 按岗位进行专业劳动分工
- 权责一致\纪律
- 个人利益服从整体利益
- 公平报酬
- 合适的集权与分权\秩序
- 人员稳定
- 团结与协作

韦伯的人事管理理论

- 劳动分工
- 法定职权
- 正式的选拔
- 非人格性

古典管理理论的共同点

- 关于人事管理的学说，对人事管理做出了重要的贡献
- 大大地提高了工作效率，促进了社会的发展和员工生活的改善。
- “胡萝卜加大棒”的管理方式
- 生产方式的改变，特别是从主要依靠体力劳动，转变为主要依靠脑力劳动的改变，这种管理方式失去了原有的作用。


行为科学阶段管理理论

- 霍桑实验（照明\福利\访谈\群体）
- 工人是“社会人”，不是“经济的人”
- 劳动生产率不仅受生产技术和工作方法的影响，而且，还会受到人的心理因素的影响，如：行为与情绪
- 管理者应重视非正式组织的作用

马斯洛的需求层次理论



赫兹伯格的双因素理论

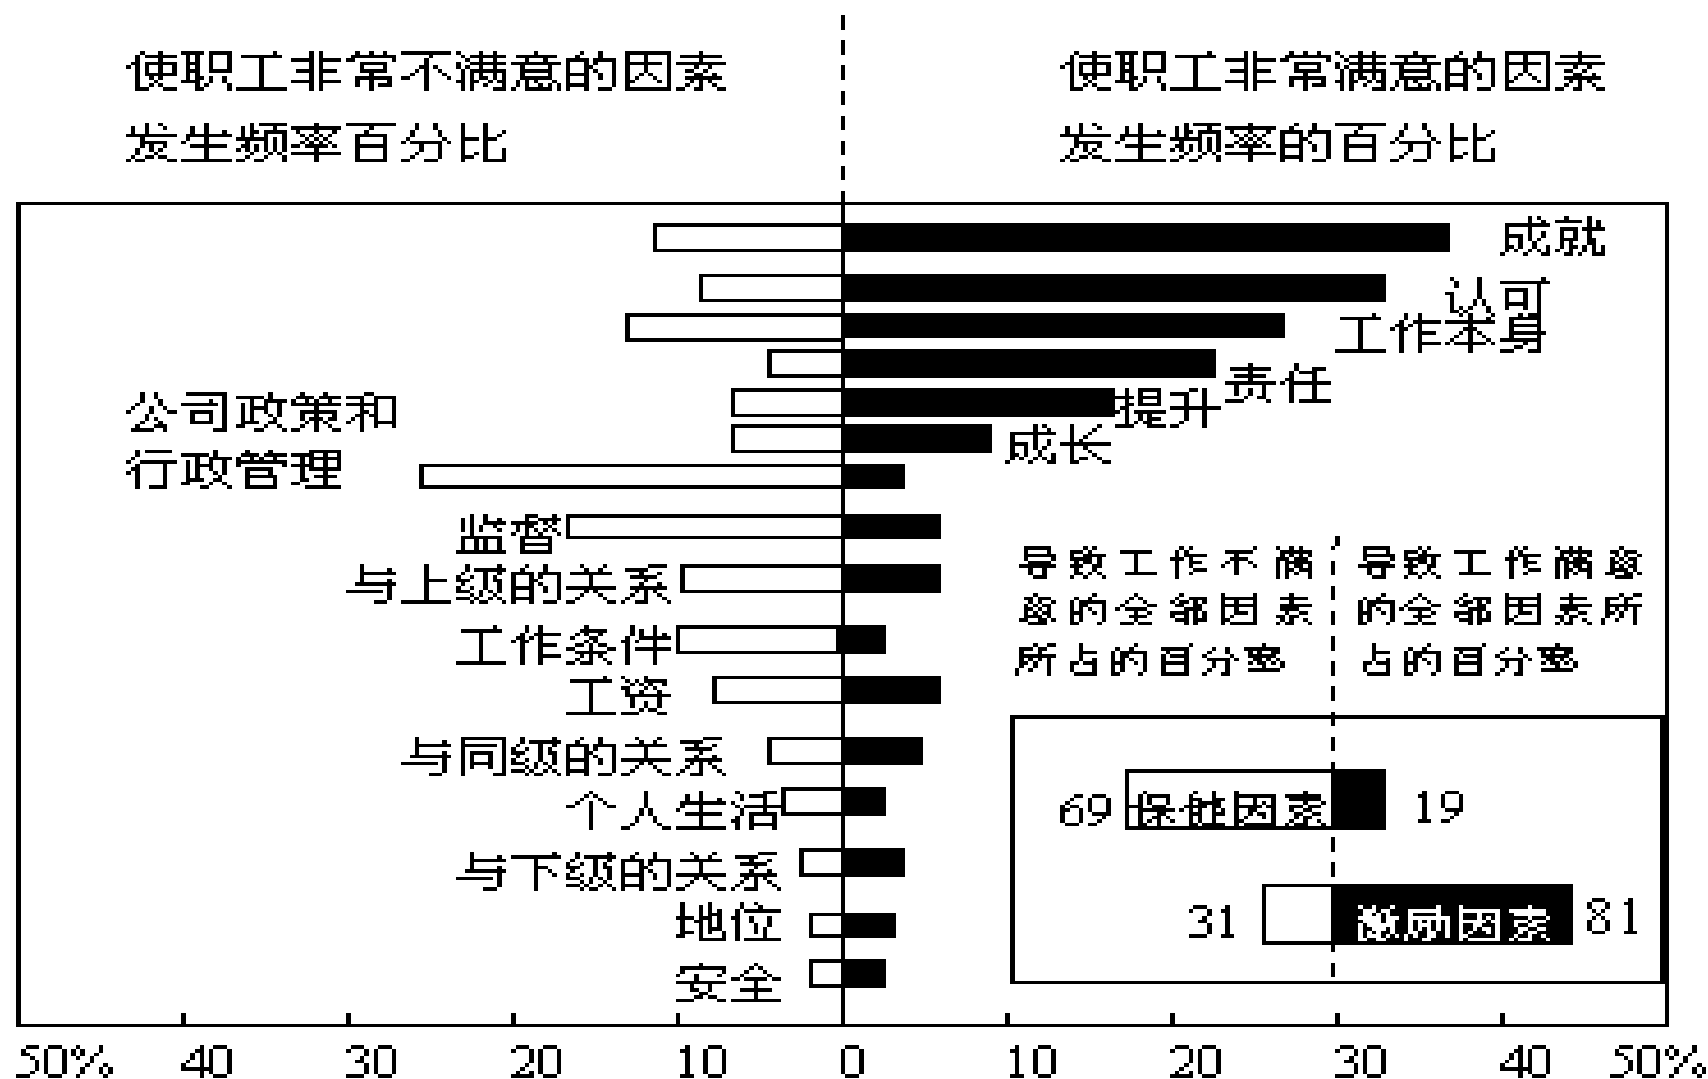

麦格雷戈的XY理论

■ X理论

- 人是经济人，人天生是懒惰的
- 生活的目的就是追求物质方面的满足
- 必须强迫他们工作

■ Y理论

- 人是自我实现的人
- 员工能够自我监督和控制，能主动承担责任，具有创造精神
- 员工都是善良的，完全可以通过激励的方式使其自觉地为企业工作。

激励的含义

■ 激励

- 通过调整外因来调动内因而使得被激励者向着激励预期的方向发展。
- ‘激’即诱发动机
- ‘励’即强化行为
- 激励实质上是一个外部引导行为来激发内部动力的过程。

■ 激励

= 激发动机（内部）+ 引导行为（外部）

激励机制设计的原则—1

■ 系统性原则

- 须使各层次、部门人员利益目标趋于一致

■ 奖励性原则

- 为什么A店员工受欢迎？

■ 合理性原则

- 激励措施适度，不能过分，亦不能不足

■ 明确性原则

- 激励机制要明确，公开，透明，直观

激励机制设计的原则—2

■ 渗透性原则

- 物质激励与精神激励相互渗透结合

■ 时效性原则

- 过早则失去继续努力的动力，过晚则失去耐心

■ 多样性原则

- 人的需求多样性、多层次性、动机的复杂性


■ 适应性原则

- 激励机制不是一劳永逸的，要适时变化。

项目团队的障碍

- 托木实验
- 协作反而导致惩罚
 - 每个人都希望项目成功，但比期望成功更重要的是人人都不希望自己挨批评，受惩罚
- 先保护自己再获取成果
 - 想让人跑得快，放一条狗在他后面
 - 引入内部竞争机制和末位淘汰使人们时刻想着保护自己

障碍--目标没有挑战性

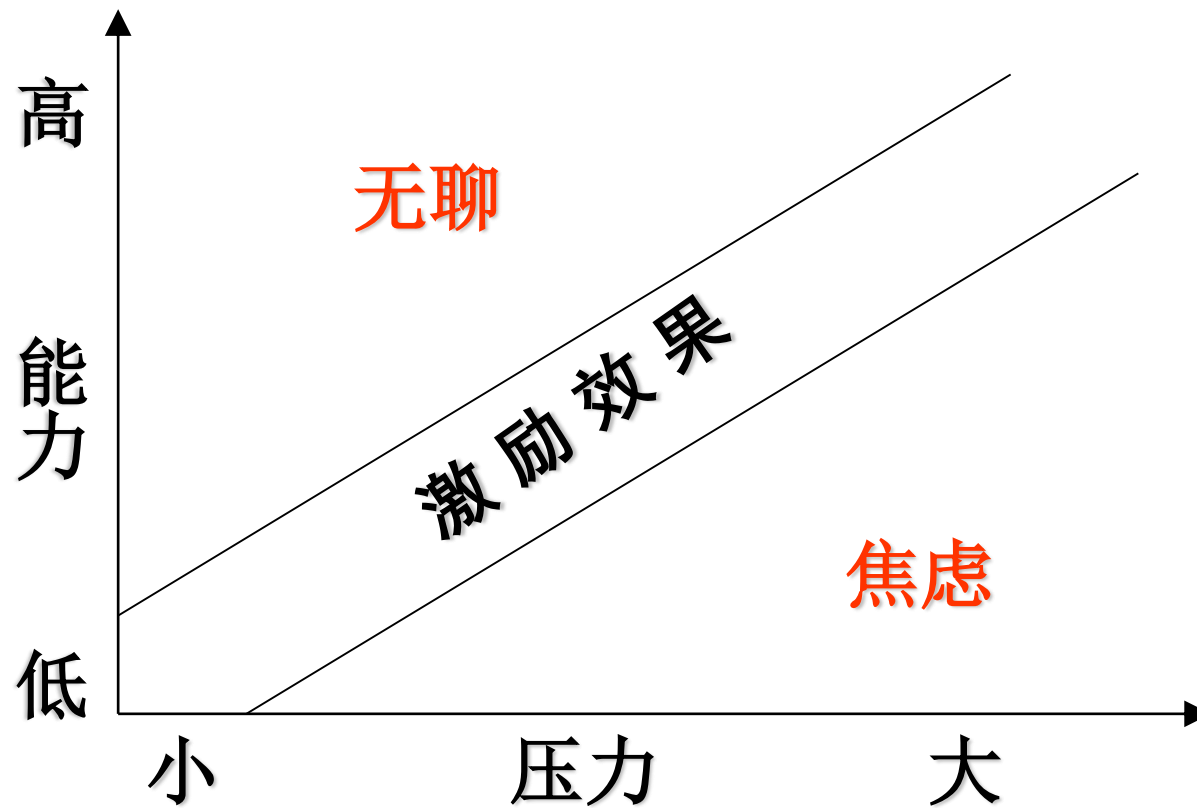


“心理转变”理论

- 第一阶段：“依从”
- 第二阶段：“认同”
- 第三阶段：“内化”

团队建设要尊重科学规律

项目团队的发展阶段

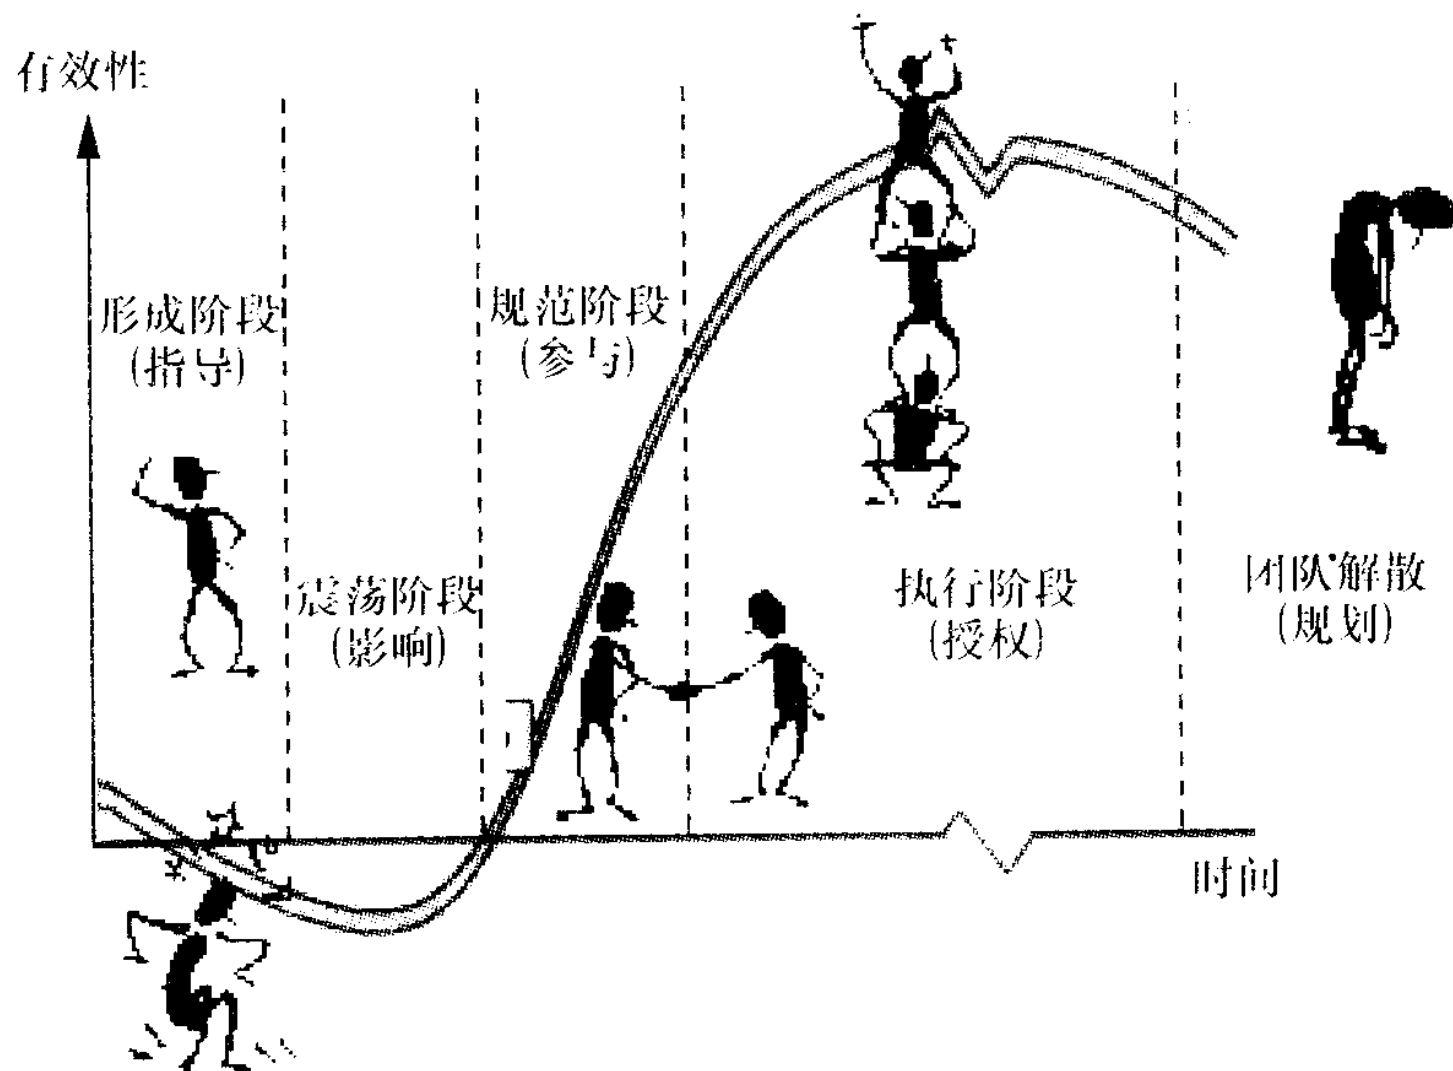

阶段	基本特征	明显特点	管理方式
形成阶段	效率较低，士气较高	渴望相互了解； 希望了解项目；尝试摸索。	指导型
磨合阶段	效率较低，士气回落	容易发现别人的弱点；感到期望与现实脱节。	影响型
规范阶段	效率提升， 士气提升	成员学会沟通和相互理解；建立起相互信任；提升工作技能；注意力集中于项目目标。	参与型
执行阶段	效率稳定， 士气稳定	团队成员的状态达到较高水平；成员为实现目标而共同努力；成员之间真诚、及时沟通，分享信息；有效的分工协作；具有较强的归属感。	参与型
解散阶段	成员面对离别， 感到失落		

各阶段管理方式

阶段	行为上	决策上	沟通上	监督上	定位上
形成阶段	告诉下属做什么	领导决定	单向沟通	频率高、力度较大	以领导为中心
磨合阶段	不仅告诉做什么，且相信其能够做好	征求意见再做决定	双向沟通，重视反馈	频率较命令式低、力度但仍然较高	领导稍微退出中心一点
规范阶段	同上	鼓励成员参与决策	主动询问、注重倾听	频率低，更重视宏观控制	领导退出中心
执行阶段	交代任务，相信能力	制定目标、权利下放	注重倾听和反馈	力度大大减弱	领导退出中心

企业需要什么人

- 认同价值观 + 没有能力 --- 老员工✓
- 不认同价值观 + 有能力 --- 空降兵✓
- 认同价值观 + 有能力 --- 选择他✓
- 不认同价值观 + 没有能力 --- 辞退 X

人的性格特征坐标分类法-1

■ 直性-柔性

- 影响别人和左右局面的能力

■ 柔性

- 优柔寡断，不太冒风险
- 耐心，善问，善听

■ 直性

- 敢冒风险，善作决定
- 正视现实，善于表达
- 缺乏耐心

人的性格特征坐标分类法-2

■ 豁达-拘谨

- 人们的内心思想，感情动机

■ 豁达

- 放松随意, 古道热肠
- 喜欢务虚, 看重人际关系
- 感情外露, 时间观念淡薄

■ 拘谨

- 认真刻板, 循规蹈矩
- 喜欢务实, 看重工作
- 感情隐藏, 时间观念强

人的性格特征坐标分类法



四种类型的人

- 社会型
 - 与员工开开玩笑，拍拍打打
 - 氛围变得热闹
- 指导型
 - 自己坐下，“人都到齐了，我们开会”，
 - 会场立刻安静
- 合作型
 - 与大家寒暄
- 理智型
 - 慢条斯理地谈年度计划

项目团队的能力来自和谐

- 五个手指同样重要
- 指导型-使项目组保持项目方向
- 社会型-调和团队矛盾大师
- 合作型-项目组润滑剂
- 理智型-严密的分析家和对质量精益求精的人

三种管理风格

- 集权式
- 参与式
- 授权式

项目组生命期

■ 形成期

- 礼貌，指导型，参与式与集权式

■ 风暴期

- 冲突，沟通，社会型，集权式

■ 规范期

- 公认标准和价值观，合作型，授权加重

■ 成果期

- 战斗力，成果多，理智型，授权式

■ 结束期

- 效率低，每种人都有用处，集权处理分配竞争

项目各阶段人力资源工作

■ 启动阶段：

- 确定项目经理
- 人员获取，建立一个合适的项目团队

■ 计划阶段：

- 在项目范围和工作说明中，考虑人力资源因素
- 在工作分解结构中，考虑人力资源因素
- 编制项目的人力资源管理计划
- 在成本估算中，考虑人力资源因素
- 在制定项目进度计划中，考虑人力资源因素
- 在编制项目预算中，考虑人力资源因素

项目各阶段人力资源工作

■ 实施阶段：

- 团队建设与沟通
- 计划跟踪中的人力资源因素
- 质量管理中的人力资源因素
- 变更控制中的人力资源因素

■ 收尾阶段：

- 项目总结与考核奖罚

有效授权的要点(上)

■ 创造授权文化

- 管理人员心态的自我调整
- 引导管理者明白授权的必要性(黄炳)
- 创造授权和勇于承担责任创新的气氛

■ 公开授权

- 授权的范围是明确的
- 授权是正式公开的

■ 沟通授权

- 双方对授权的目的有相同理解
- 事先确立绩效评估的基准
- 事先确定报告期

有效授权的要点(下)

■ 择人受权

- 授权者了解受权者的能力
- 授权者了解受权者对权力的期望

■ 择事授权择时授权

- 哪些事是可授权的，哪些不能授权
- 技术类的决策都可以授权吗，如何控制

■ 授权后的支持要有度

- 需要时提供帮助和支持
- 不需要时不要过多地问询和检查(中国主管)
- 关怀适当,你的计划与某某说了吗
- 根据受权人的成熟度决定报告期

专业领域技术编制表

	系统分析员	程序员	测试工程师	硬件工程师	数据库管理员
赵伊	5	4	3	2	1
王耳	5	5	4	3	2
张山	2	5	4	4	3
李斯	2	5	5	3	4
邓武	3	4	5	2	4
崔柳	2	3	3	3	5
陈琪	2	2	3	5	3
高跋	3	4	3	3	5

项目组成员责任表(职责分配矩阵)

	赵伊	王耳	张山	李斯	邓武	崔柳	陈琪	高跋
系统分析	P	S			S			S
数据库设计				S		P		S
编程实现	S	S	P	S	S			S
设备采购			S			S	P	
系统测试		S	S	P	S			

项目团队的知识地图

	知识点一		知识点二		知识点 N	
	能力	兴趣	能力	兴趣	能力	兴趣
张三	100	100				
李四			10	10		
王五					5	5


项目成员的责任分配

	成员甲	成员乙	成员丙	成员丁
工作包一	P	S₁	S	
工作包二		P	S₁	S
工作包三	S		P	S₁


知识地图的绘制方法

- 每小组部门绘制组内部门知识地图
- 每小组各派1至2名代表参与讨论企业知识点
- 代表将反馈意见带回组内，调整组内知识点
- 各组代表再牵头形成企业知识地图
- 知识地图出来后，放在企业内部网上
- 按照知识点主题的不同，形成若干个虚拟社区
- 一周或一月后，由个人申报(3), 对其他成员打分(4), 主管打分(3), 形成知识点的专家顺序
- 列出个人在各知识点的兴趣
- 定期审查知识地图


反映人力资源需求的的网络图

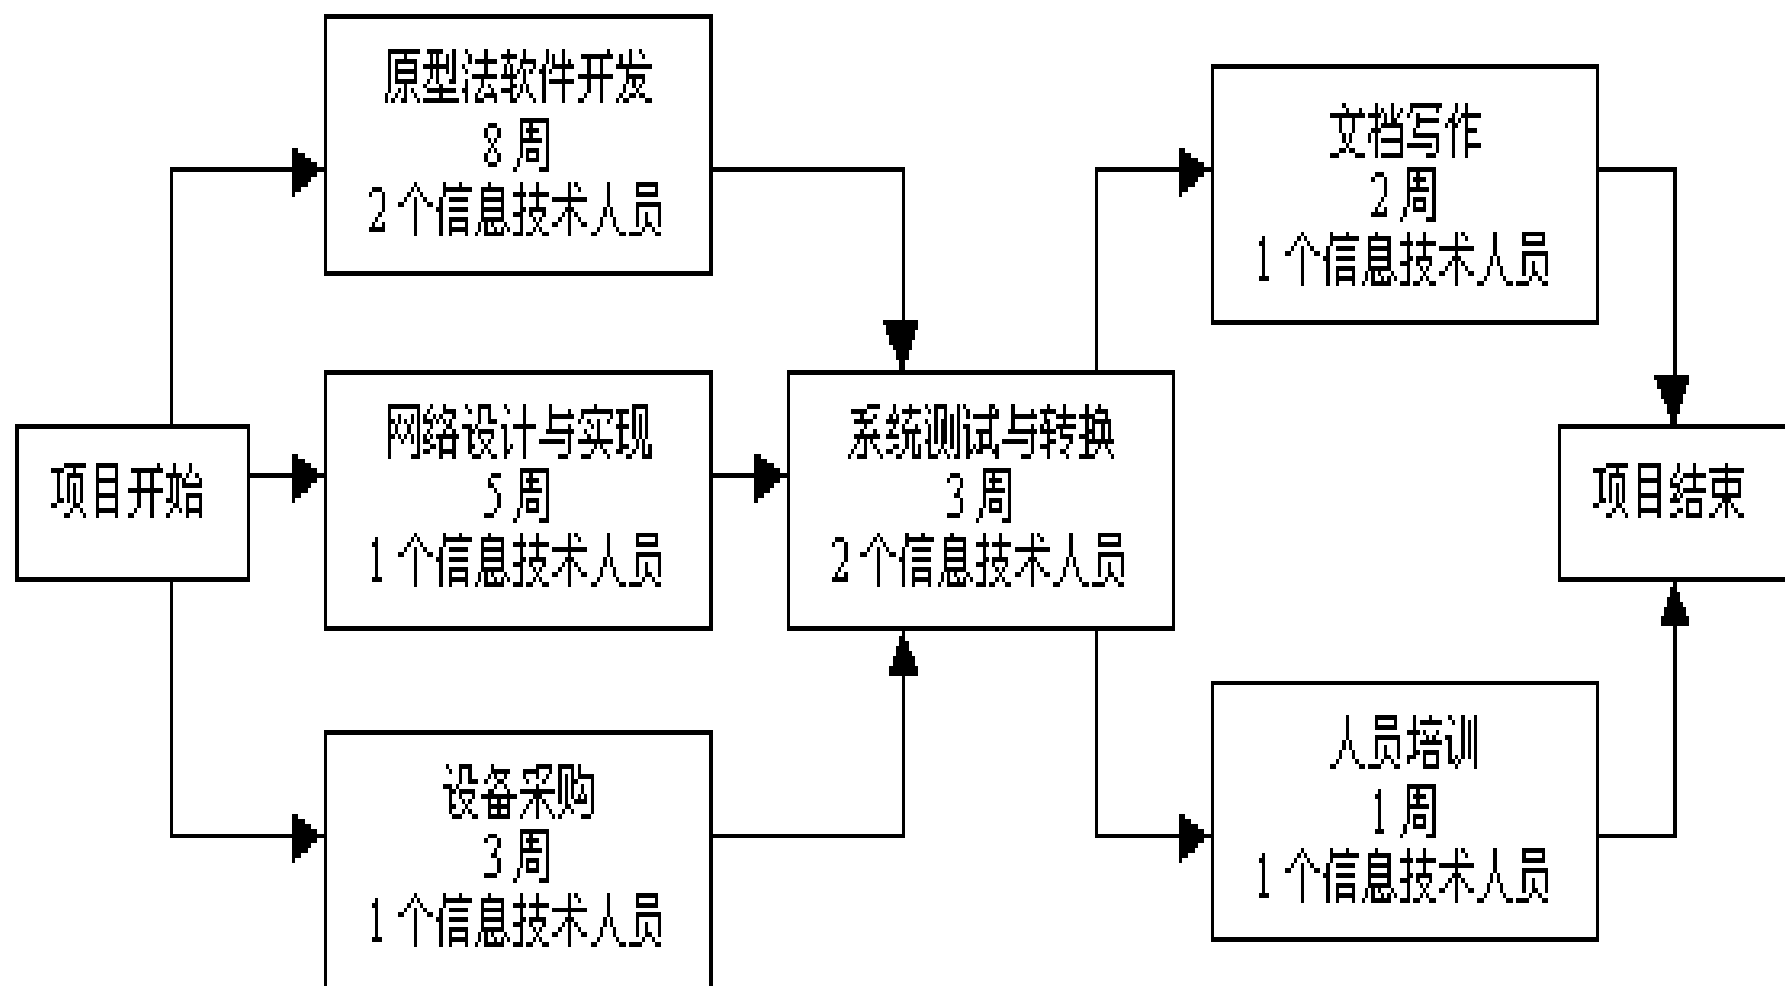


基于活动最早开始时间 的人力资源计划图

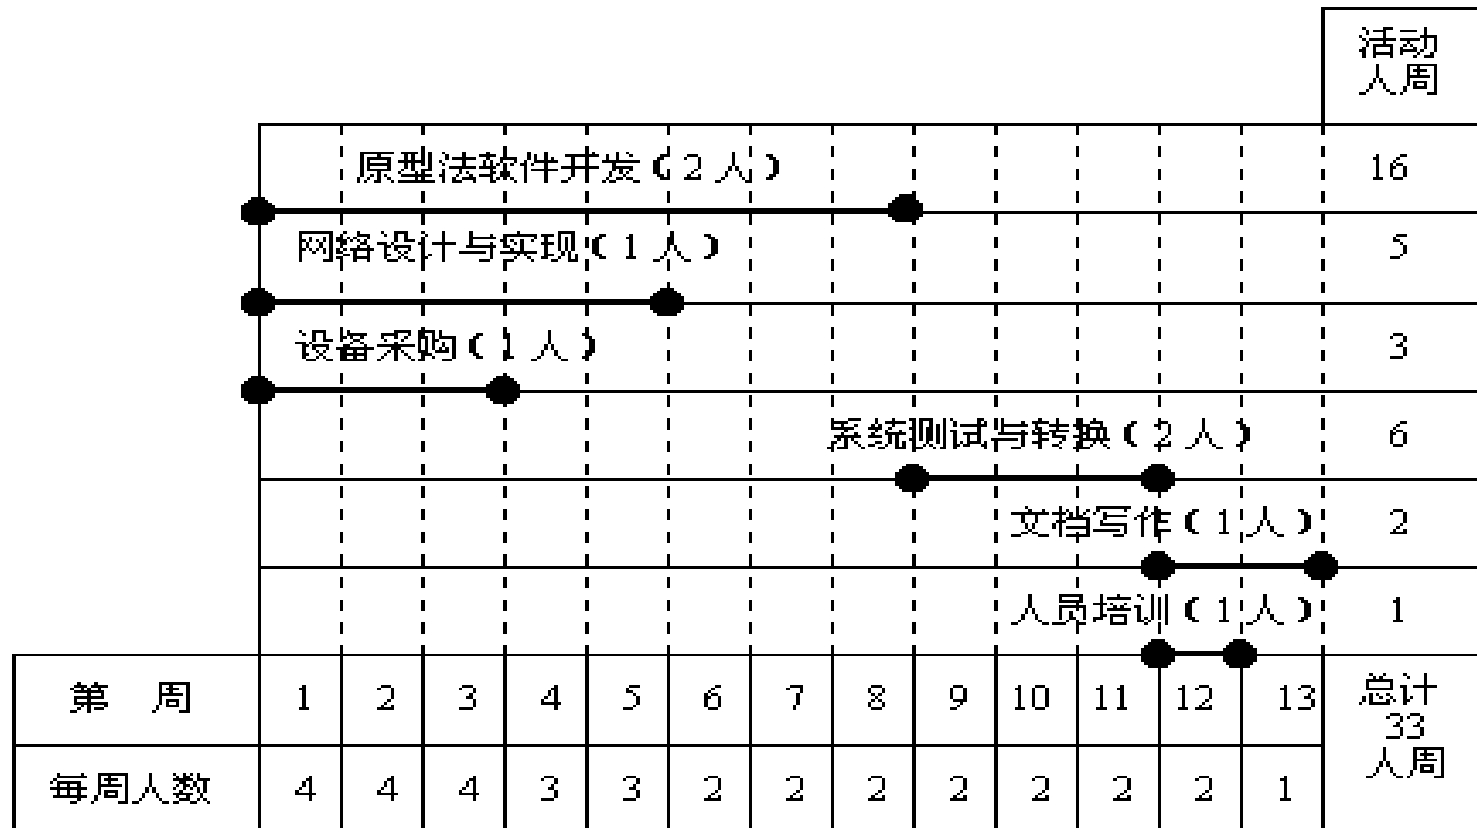

(a)

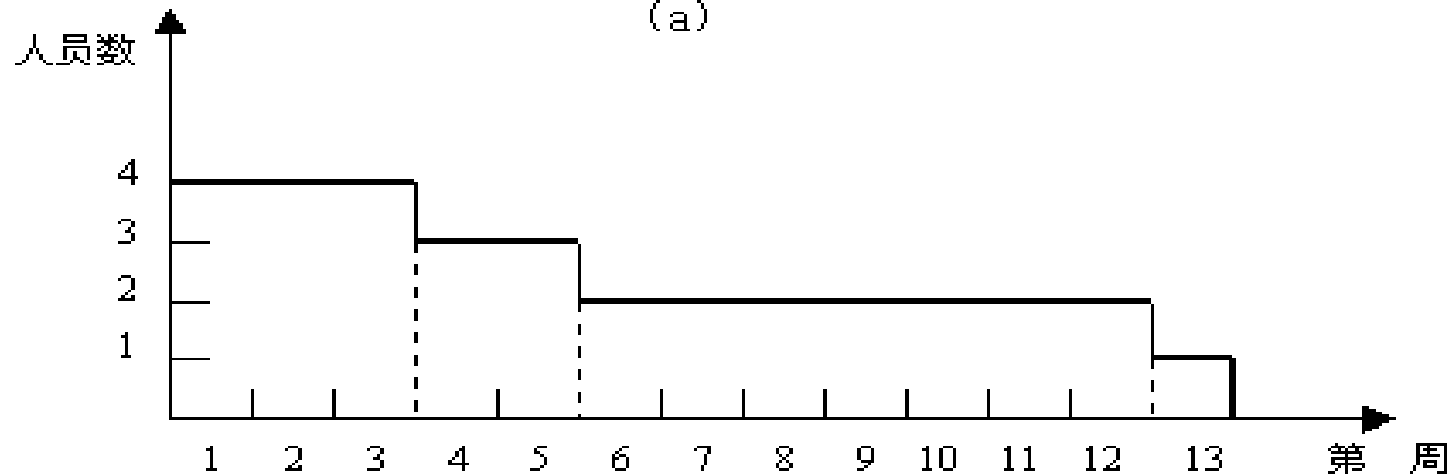

基于资源平衡的人力资源计划图

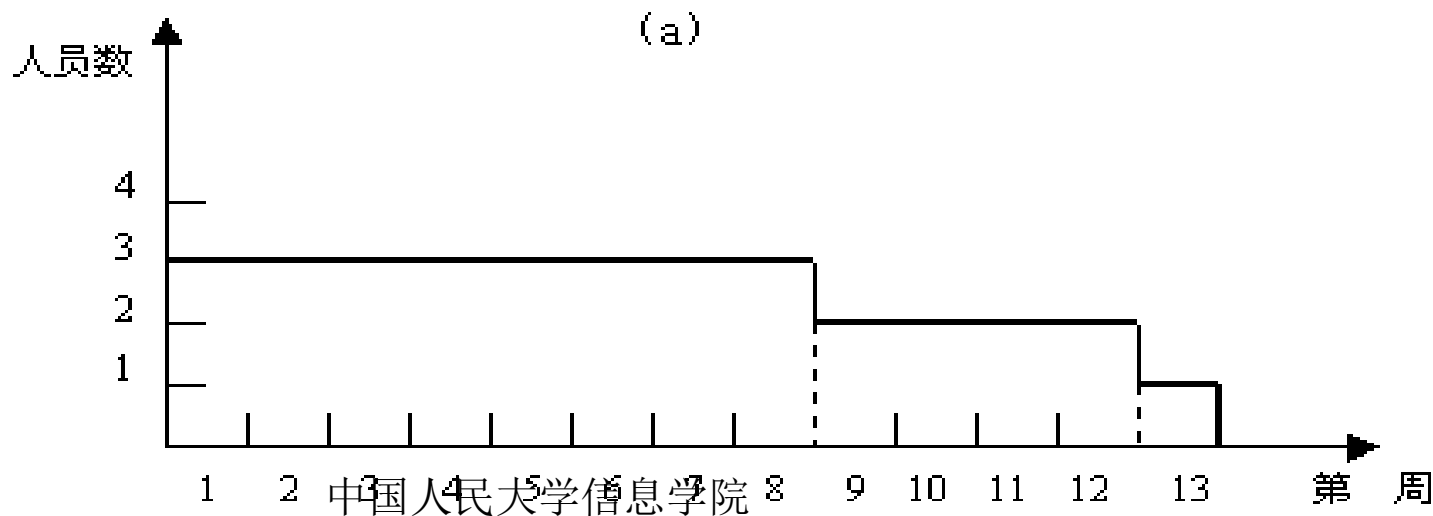


2. 项目沟通管理

我说我恨你，就真的恨你吗？

我说我爱你，就真的爱你吗？

我真的搞不懂！

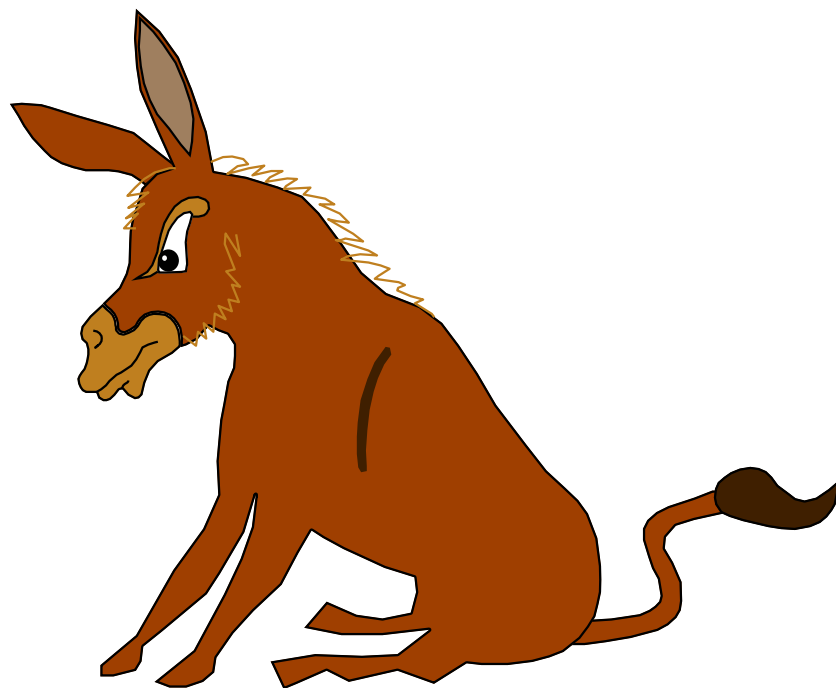

沟通的概念

为了设定的目标，把信息，思想和情感在个人或群体间传递，并达成协议的过程。

双70定律

- 管理者70%的时间用于沟通
- 70%的出错是由于沟通失误引起的

项目沟通的作用

- 决策和计划的基础
- 组织和控制的依据和手段
- 建立和改善人际关系条件
- 项目经理成功领导的手段

项目沟通管理

PMBOK指南第五版		PMBOK指南第六版	
10.1	规划沟通管理	10.1	规划沟通管理
10.2	管理沟通	10.2	管理沟通
10.3	控制沟通	10.3	监控沟通

因为人在交流时，其交流方式和时间无法控制，所以控制沟通这一过程名称修改为监控沟通。

干系人识别

- 谁是沟通对象
- 分类
- 分层次
- 关键干系人

项目沟通计划的内容

- 信息收集渠道的结构
- 沟通日程表
- 信息分发的格式
- 信息分发渠道的结构
- 沟通计划更新和细化方法

项目沟通计划的要点

☞ 决定信息发送的方法

e-mail/电话/面谈/会议/信函

How?

☞ 何时发送信息

时间是否恰当

When?

☞ 确定信息内容

简洁/强调重点/熟悉的语言

What?

☞ 谁该接受信息？

先获得接受者的注意

接受者的观念/需要/情绪

Who?

☞ 何处发送信息？

地点是否合适

不被干扰

Where?


项目沟通计划必须规范

- 明确沟通目的
- 明确沟通对象
- 确定沟通内容
 - **KISS原则: Keep It Simple and Short**
 - 金字塔 900块石 不等于90%
- 确定沟通方式和时间
 - 我忘了告诉你，他们昨天已经招标结束了

项目沟通计划一例

- 1、采用双向沟通的同时，保证平行沟通。
- 2、口头和书面沟通；在每两周的周五和项目组成员进行全体的沟通总结。在每周二进行个别模块的口头沟通，随时个人口头沟通。
- 3、对于在项目进展过程中随时发现的问题，会与当事人先进行书面沟通，然后必要的时候，进行口头沟通。
- 4、书面沟通的时候，一般通过邮件，要注明姓名、原因、事件、时间、解决方式。
- 5、成员间要把信息及时的反馈给相应的人员那里。
- 6、项目组内部顾问和外部顾问，模块内最好用邮件，尤其是安排工作方面，并且抄送到项目经理。
- 7、目前项目组成员比较年轻，项目经验较少，建议大家以虚心学习的态度，从小事做起，完善和提高自己得各个方面得能力，与此同时，希望大家对于顾问安排得工作，你们要懂得区分辨认，对于自己有些犹豫或是感觉做不好得工作，最好不要立刻答应承担下来，可以跟我沟通后，在作出决定
- 8、通过邮件来发布信息，并且要对发布得信息负责，内容要简捷、清晰。
- 9、对于在会议中通知的决议，会后要把会议纪要发到相应得人员那里，在会议中布置得工作，在会后要有跟踪，大学信及时反馈给相应得负责人员。

信息沟通过程图

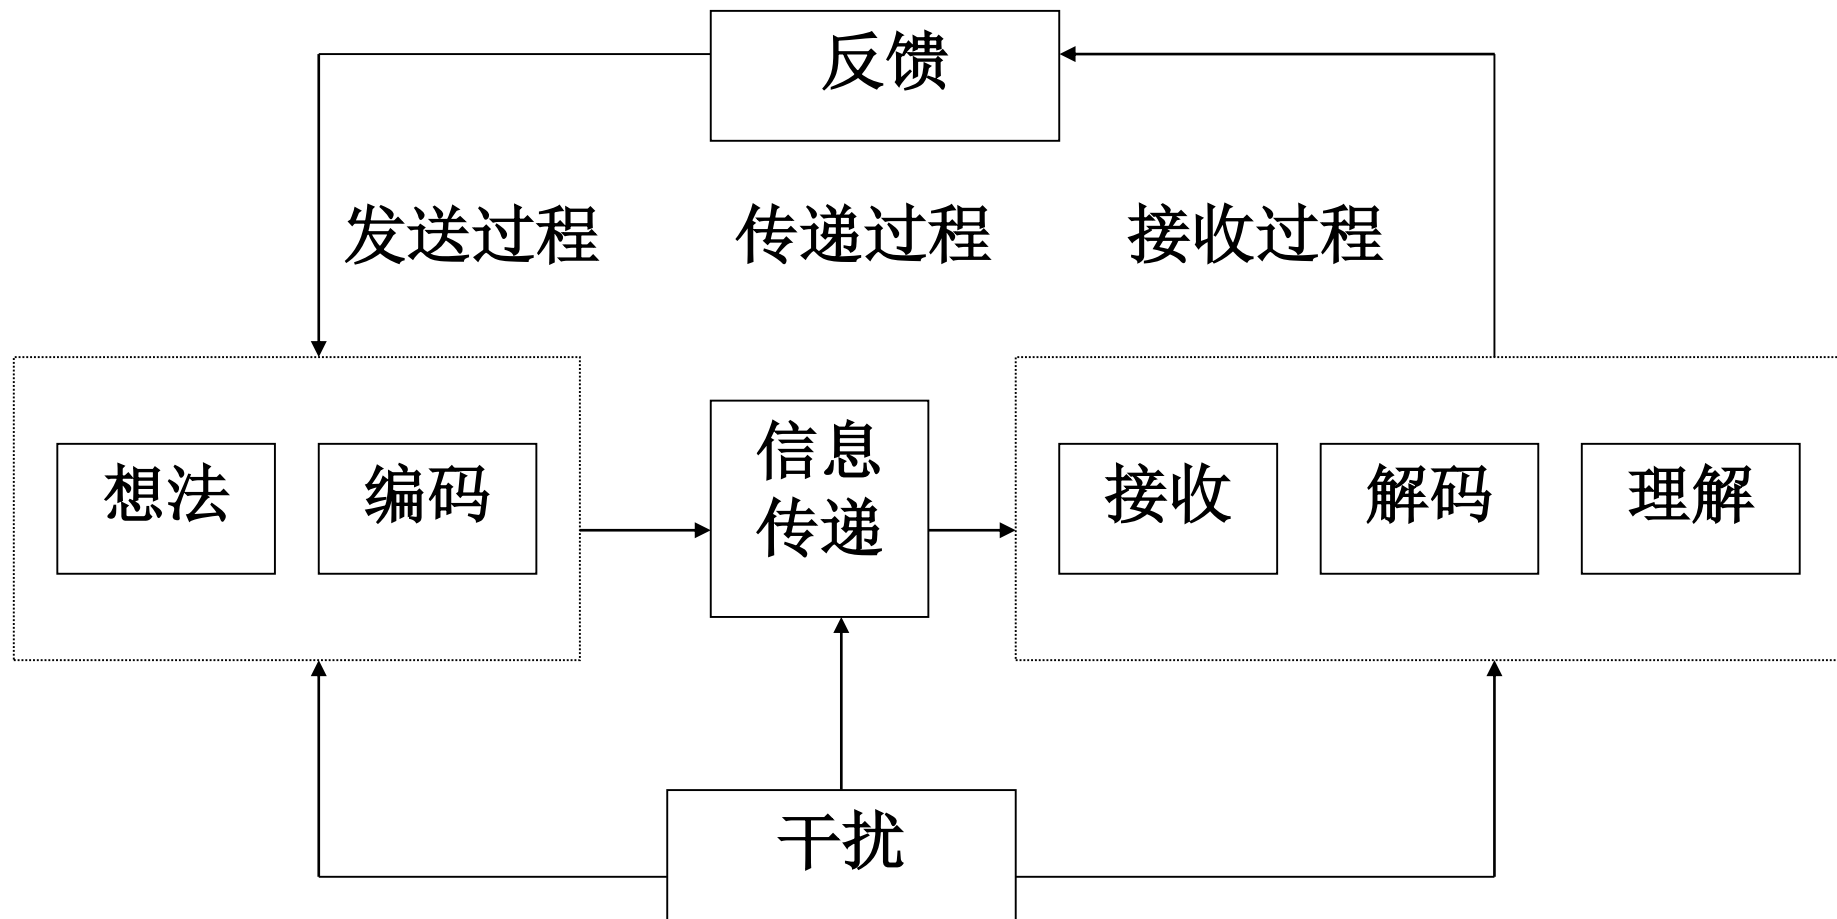


跨文化沟通的沟通模型

当前情绪

文化：

- 代际
- 国家
- 专业学科
- 性别

个性偏见
(假设)

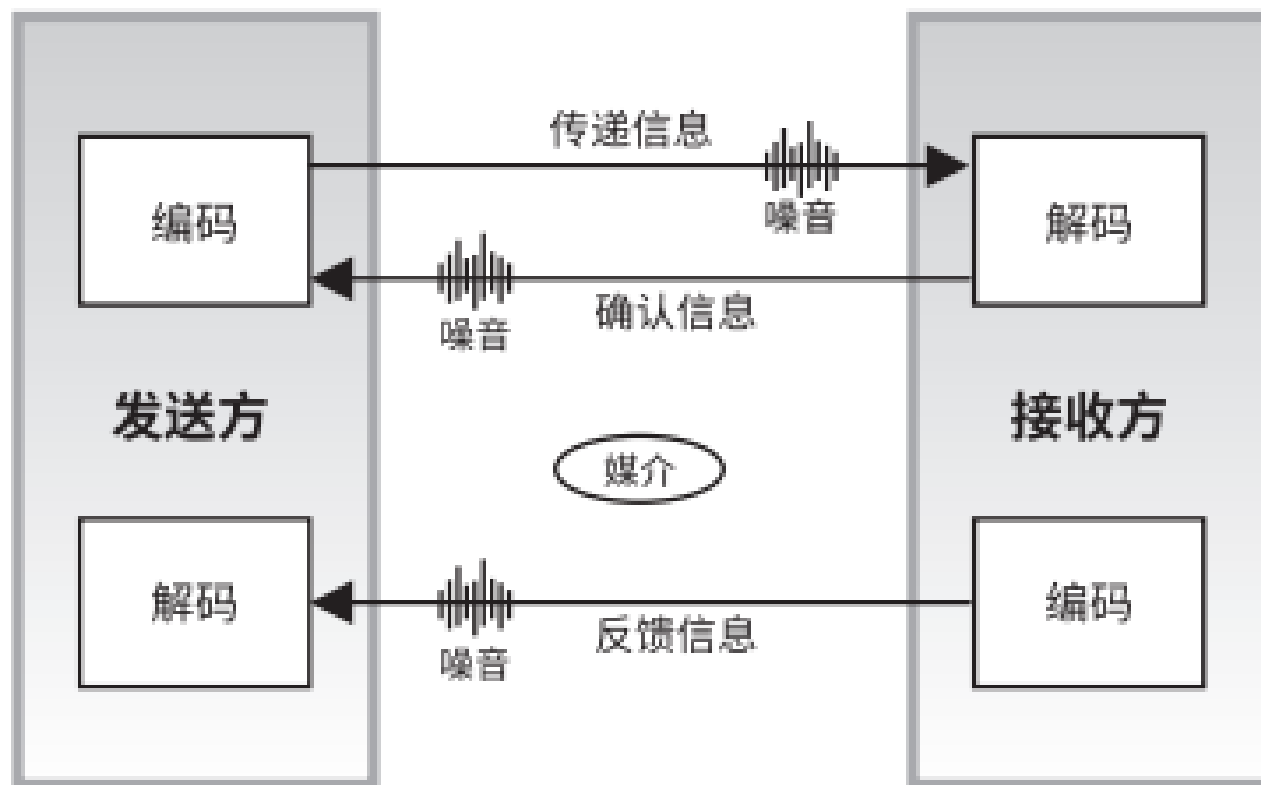

当前情绪

文化：


- 代际
- 国家
- 专业学科
- 性别

个性偏见
(假设)


沟通方式方法

- 正式沟通、非正式沟通
- 上行沟通、下行沟通、平行沟通
- 单向沟通、双向沟通
- 书面沟通、口头沟通
- 言语沟通、体语沟通
 - 肢体语言55% 声音和语调38% 内容7%


正式沟通的五种类型




链式

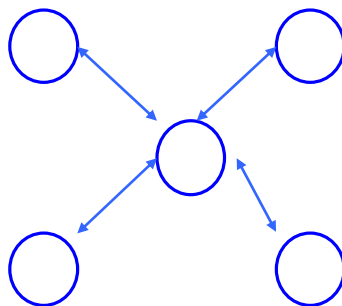


轮式

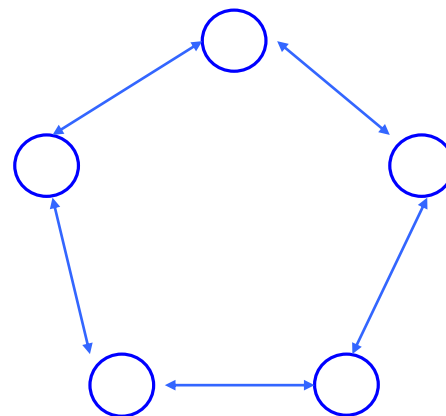

环式

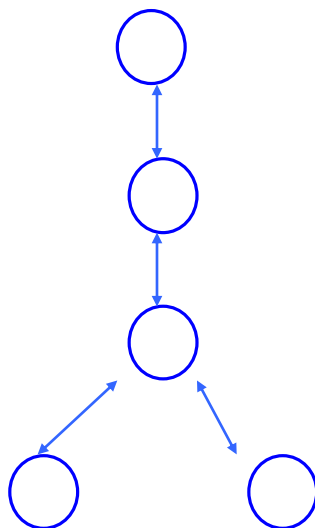


倒Y式

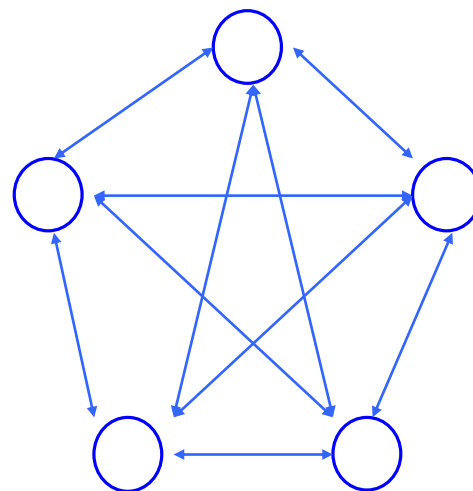


全通道式


非正式沟通的四种类型

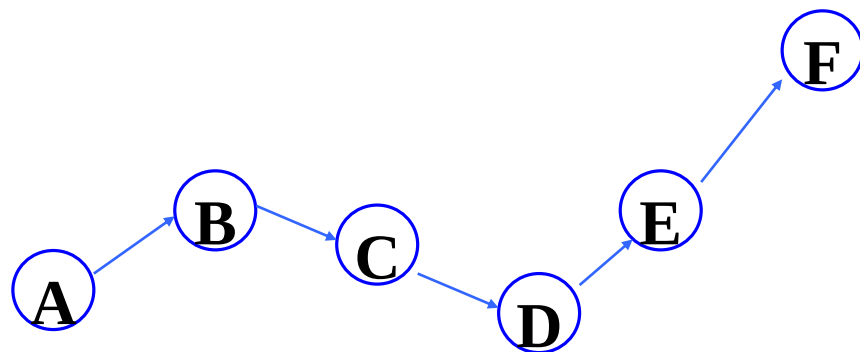


单线式

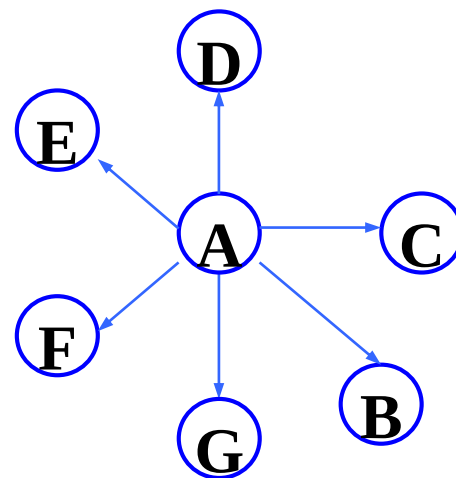

流言式

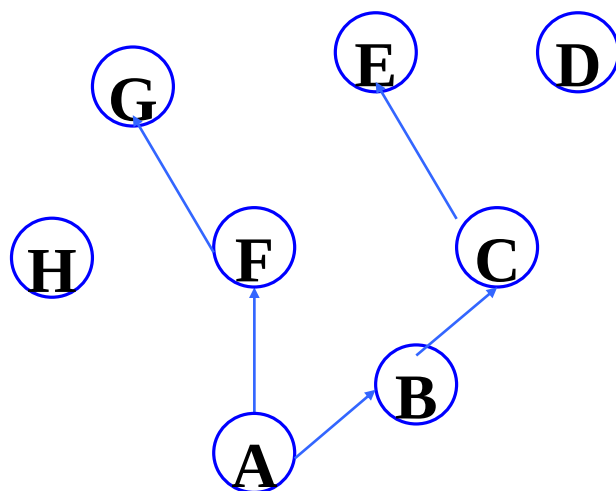


偶然式

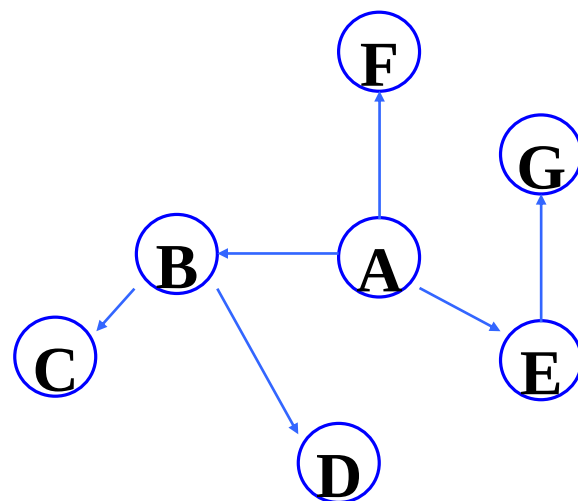

集束式

项目经理的沟通的方向

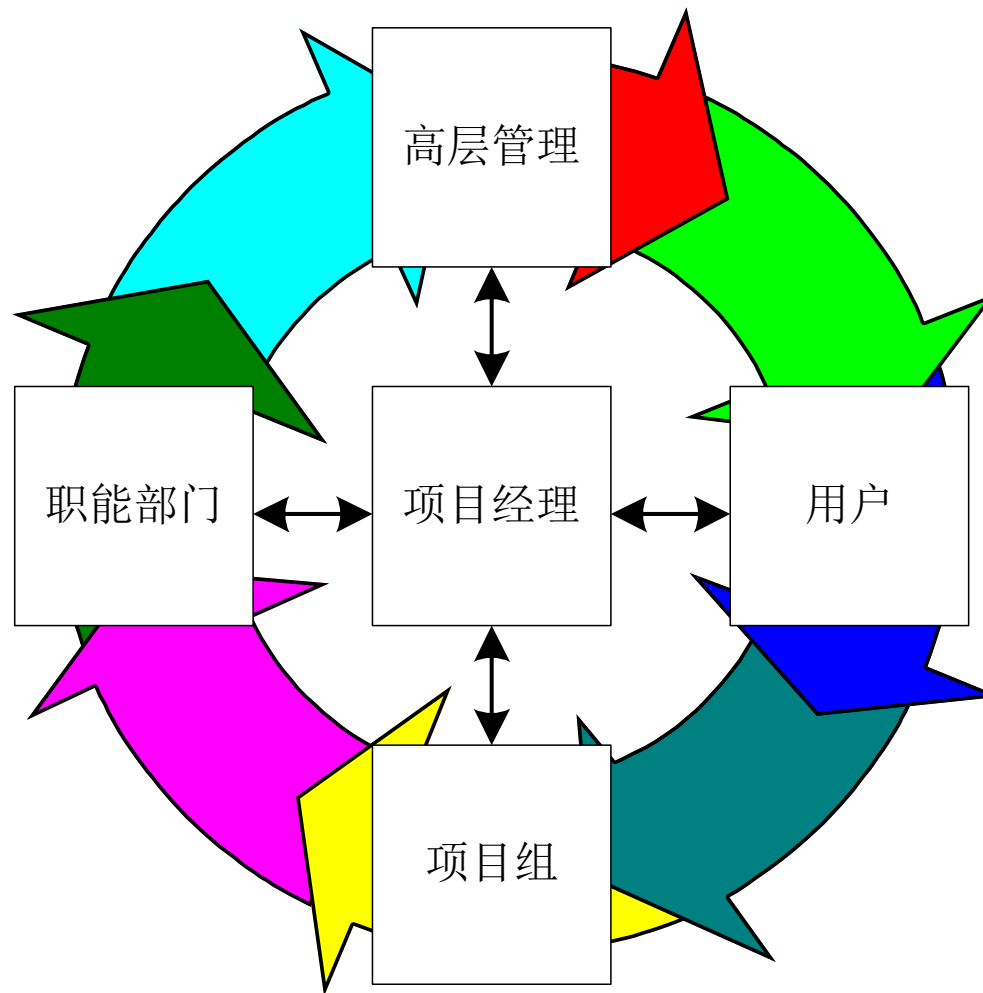


你的视野有多宽

- 我们看到的并非客观世界本身，只是客观世界在我们心中的反映
- “智子疑邻” 效应
 - 大雨淋坏高墙，富人家被盗
- 你看到了什么
 - 科学家与罪犯
 - 向高矮杯子倒饮料的实验

了解区域

	自己了解自己	自己不了解自己
别人了解你	开放区域	盲目区域
别人不了解你	秘密区域	未知区域

谨防“信息漏斗”

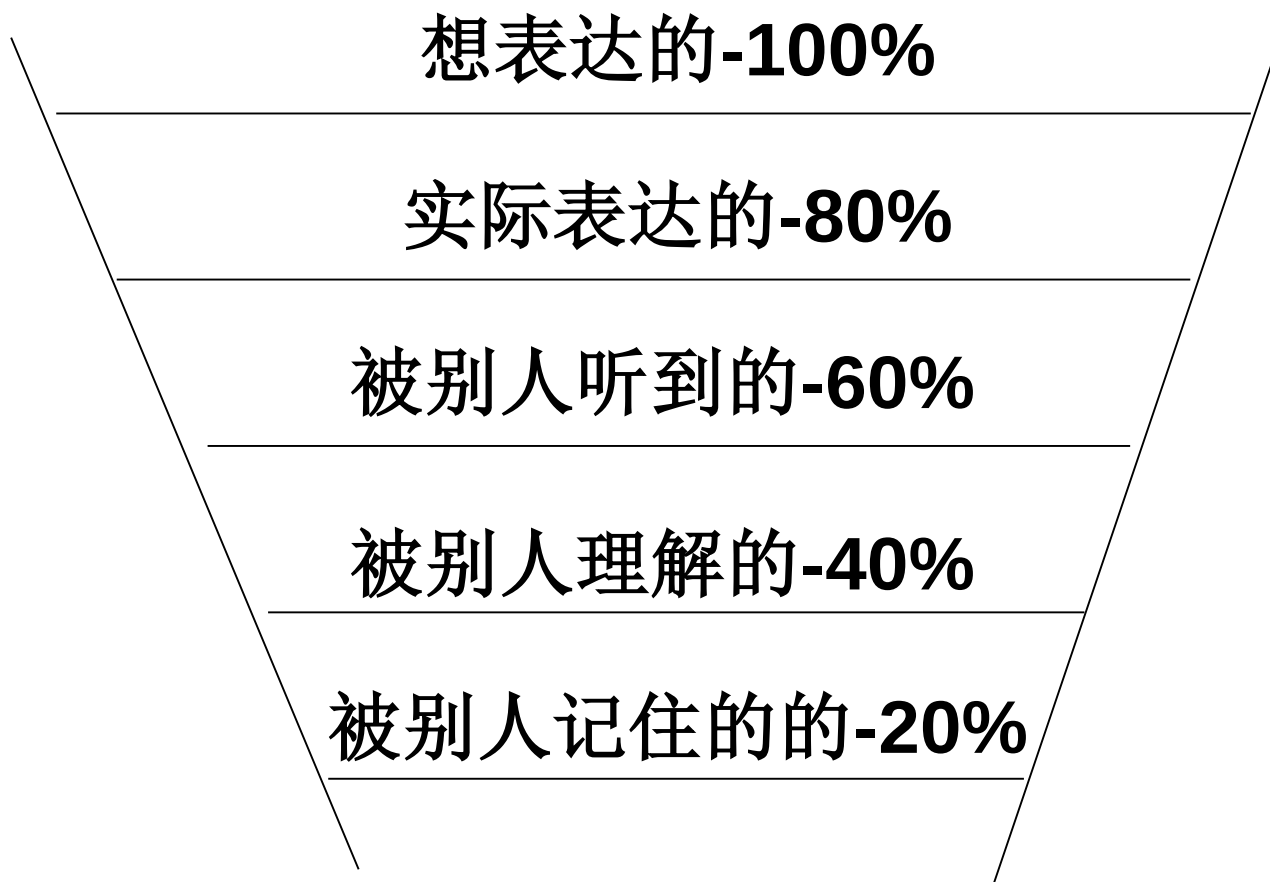

企业信息沟通主要渠道

信息来源	调查结果	实际情况
顶头上司	1	1
小组会议	2	3
老板/最上层经理	3	10
年度报告	4	8
员工手册	5	5
工作计划书	6	11
部门内部刊物	7	7
公司内部刊物	8	6
布告栏	9	4
自下而上的交流计划	10	15
群众大会	11	9
视听节目	12	14
工会	13	12
流言飞语、小道消息	14	2
大众传媒	15	13

沟通中常见的问题

■ 语言问题

- 汉语夹杂英语、专业设备

■ 知识层次的不同

■ 用深奥的语言表达简单的道理

- “一个人用一个金属的齿状物去撬动了一块由淀粉构成的物体”
- “贤妻，迅燃银灯，尔夫为毒虫所袭！”

■ 缺乏面对面的交流

建立有效的反馈机制

■ 反馈机制回答三个问题

- 信息是否已经被接受
- 信息是否已经被理解
- 信息沟通目的是否达到

■ 下班回家没准时，家人怎么想

■ 钉子与战役

- 少了钉子-战马不能上马掌-少了一匹马-一个勇士-战役失败
- 没有了反馈-利益相关者误解-失去信任-项目失败-企业破产

注意说话的语气

- 你在说什么
- 你是怎么说的
- 你的身体语言

一句话可以使人笑
一句话可以使人跳



信息传递者沟通时明确:

- 信息是传递给谁的？
- 我为什么要进行沟通？我的动机是什么？
- 充分理解被沟通者的需求(老太太买李子)
- 确定和明白需要沟通的是什么信息？
- 选择最佳时间
- 使用接收者能够理解的语言，语言明确，不可含糊其词
- 选择不妨碍信息接收、理解和接受的地点
- 与接收者保持联系

信息接收者沟通时：

- 密切关注传递者
- 积极倾听正传递的信息
- 如有必要请求解释或重复
- 与传递者保持联系

怎么和法师沟通

- 有年轻人想要出家，法师考问年轻人为什么要出家？
- 年轻人A：我爸叫我来的。
- 法师：这样重要的事情你自己都没有主见，打40大板。
- 年轻人B：是我自己喜欢来的。
- 法师：这样重要的事情你都不和家人商量，打40大板。
- 年轻人C：不作声。
- 法师：这样重要的事情想都不想就来了，打40大板。
- 如果你是年轻人D怎么和法师沟通呢？
- 年轻人D：我受到法师的感召，我很喜欢来，我爸也很支持我来！

信息传递者、接收者沟通时：

- 认识到误解是在所难免的
- 留神应该正确理解的次要刺激
- 反复听，不厌其烦地听
- 检查信息理解是否有误
- 共享由信息产生的观点、情感和知觉

如何与上司(下属)沟通

- 1.在与上司沟通前要准备好资料;
- 2.涉及方案的要有备选方案;
- 3.作好要点记录;
- 4.适用沟通礼仪,身体座正,在椅子上半座身体前倾,会意时要点头,目光落在对方三角区;
- 5.商务距离1.2~2.2M;
- 6.要向上司复述上司的指示,以确认接收信息正确无误;
- 7.有疑问和不解要提出来,邀请提问时要用手掌并手心向上,显示礼貌;
- 8.当还没有达到可以充分授权的程度时,要主动向上司回报工作进程,上司要给以方向性指导.

批评的方式

- 堂中扬善,闭门说过;
- 不要当众点名指责,可以说事不说人,不点名的批评;
- 保护善意的批评
- 表扬好的可以兼收批评不好的效果,如对准时到会者表扬,实际上也是对迟到者批评.

确保会议高效

- 会议也可以按项目方式运作
- 开会前确定议程，并准备相关材料
- 确定会议的目标，并坚持会议的目标
- 仅邀请必须的人员
- 按时开始
 - 迟到罚款合适？
- 控制会议议程
 - 严格限制每人讲话时间
- 记录会议内容，做好会议总结

会议失败的原因

- 组织不当
- 理解不透
- 备忘录有误
- 议程安排不当
- 主持人原因

会前管理表格

- 会议室（设施）申请表（+
- 会议审批表（++
- 会议分工（筹备）表（++++
- 会议预算表（+
- 会议通知（邀请）表（+++++++
- 会议通知回执表（++
- 回执统计表（+
- 会议日程（议题）安排表（+++++++

会中管理表格

- 签到表（会议资料）（+++++
- 会议记录表（+++++++

会后管理表格

- 会议纪要表 (++++++)
- 会议纪要签收单 (+
- 会议落实回执 (+
- 会议决议跟踪表 (++)
- 会议内容管理表 (+
- 会议代表通讯录 (+
- 会议决议表 (++)
- 实际费用表 (+

开放式问题与封闭式问题

封闭式问题

会议结束了吗？

你喜欢你的工作吗？

你还有问题吗？

开放式问题

会议是如何结束的？

你喜欢你的工作的
哪些方面？

你有什么问题？

沟通案例

- 公司为了奖励市场部的员工，制定了一项海南旅游计划，名额限定为10人。可是13名员工都想去，部门经理需要再向上级领导申请3个名额，如果你是部门经理，你会如何与上级领导沟通呢？

沟通方式一

部门经理向上级领导说："朱总，我们部门13个人都想去海南，可只有10个名额，剩余的3个人会有意见，能不能再给3个名额？“

朱总说："筛选一下不就完了吗？公司能拿出10个名额就花费不少了，你们怎么不多为公司考虑？你们呀，就是得寸进尺，不让你们去旅游就好了，谁也没意见。我看这样吧，你们3个做部门经理的，姿态高一点，明年再去，这不就解决了吗？“

沟通方式二

■ 部门经理："朱总，大家今天听说去旅游，非常高兴，非常感兴趣。觉得公司越来越重视员工了。领导不忘员工，真是让员工感动。朱总，这事是你们突然给大家的惊喜，不知当时你们如何想出此妙意的？"

■ 朱总："真的是想给大家一个惊喜，这一年公司效益不错，是大家的功劳，考虑到大家辛苦一年。年终了，第一，是该轻松轻松了；第二，放松后，才能更好的工作；第三，是增加公司的凝聚力。大家要高兴，我们的目的就达到了，就是让大家高兴的。"

■ 部门经理："也许是计划太好了，大家都在争这10个名额。"

■ 朱总："当时决定10个名额是因为觉得你们部门有几个人工作不够积极。你们评选一下，不够格的就不安排了，就算是对他们的一个提醒吧。"

■ 部门经理："其实我也同意领导的想法，有几个人的态度与其他人比起来是不够积极，不过他们可能有一些生活中的原因，这与我们部门经理对他们缺乏了解，没有及时调整都有关系。**责任在我**，如果不让他们去，对他们打击会不会太大？如果这种消极因素传播开来，影响不好吧。公司花了这么多钱，要是因为这个名额降低了效果太可惜了。**我知道公司每一笔开支都要精打细算**。如果公司能拿出3个名额的费用，让他们有所感悟，促进他们来年改进。那么他们多给公司带来的利益要远远大于这部分支出的费用，不知道我说的有没有道理，公司如果能再考虑一下，让他们去，我会尽力与其他两位部门经理沟通好，在这次旅途中每个人带一个，帮助他们放下包袱，树立有益公司的积极工作态度，朱总您能不能考虑下我的建议。"

多听少说

自然赋予我们人类一张嘴，
两只耳朵，也就是让我们多听
少说。

-----苏格拉底

哪个金人最有价值？

聆听的原则

- 适应讲话者的风格
- 眼耳并用
- 首先寻求理解他人，然后再被他人理解
- 鼓励他人表达自己
- 聆听全部信息(小朋友当飞行员)
- 表现出有兴趣聆听

记住下列谚语

- 对项目经理来说，最有价值又最少说的一个字是“不”。
- 客户只会告诉你问到的东西，而不会告诉你所想的東西。
- 不能落实到书面上的东西就等于没说。

《360度高效沟通技巧》

理解冲突

■ 冲突与双赢


- 双赢的障碍在于我们都希望比别人要赢得多些，认为打败对手就是胜利
- 中国家电联盟
- 过份看重市场占有率

■ 冲突有可能是有益的



沙丁鱼与鲱鱼

冲突的解决

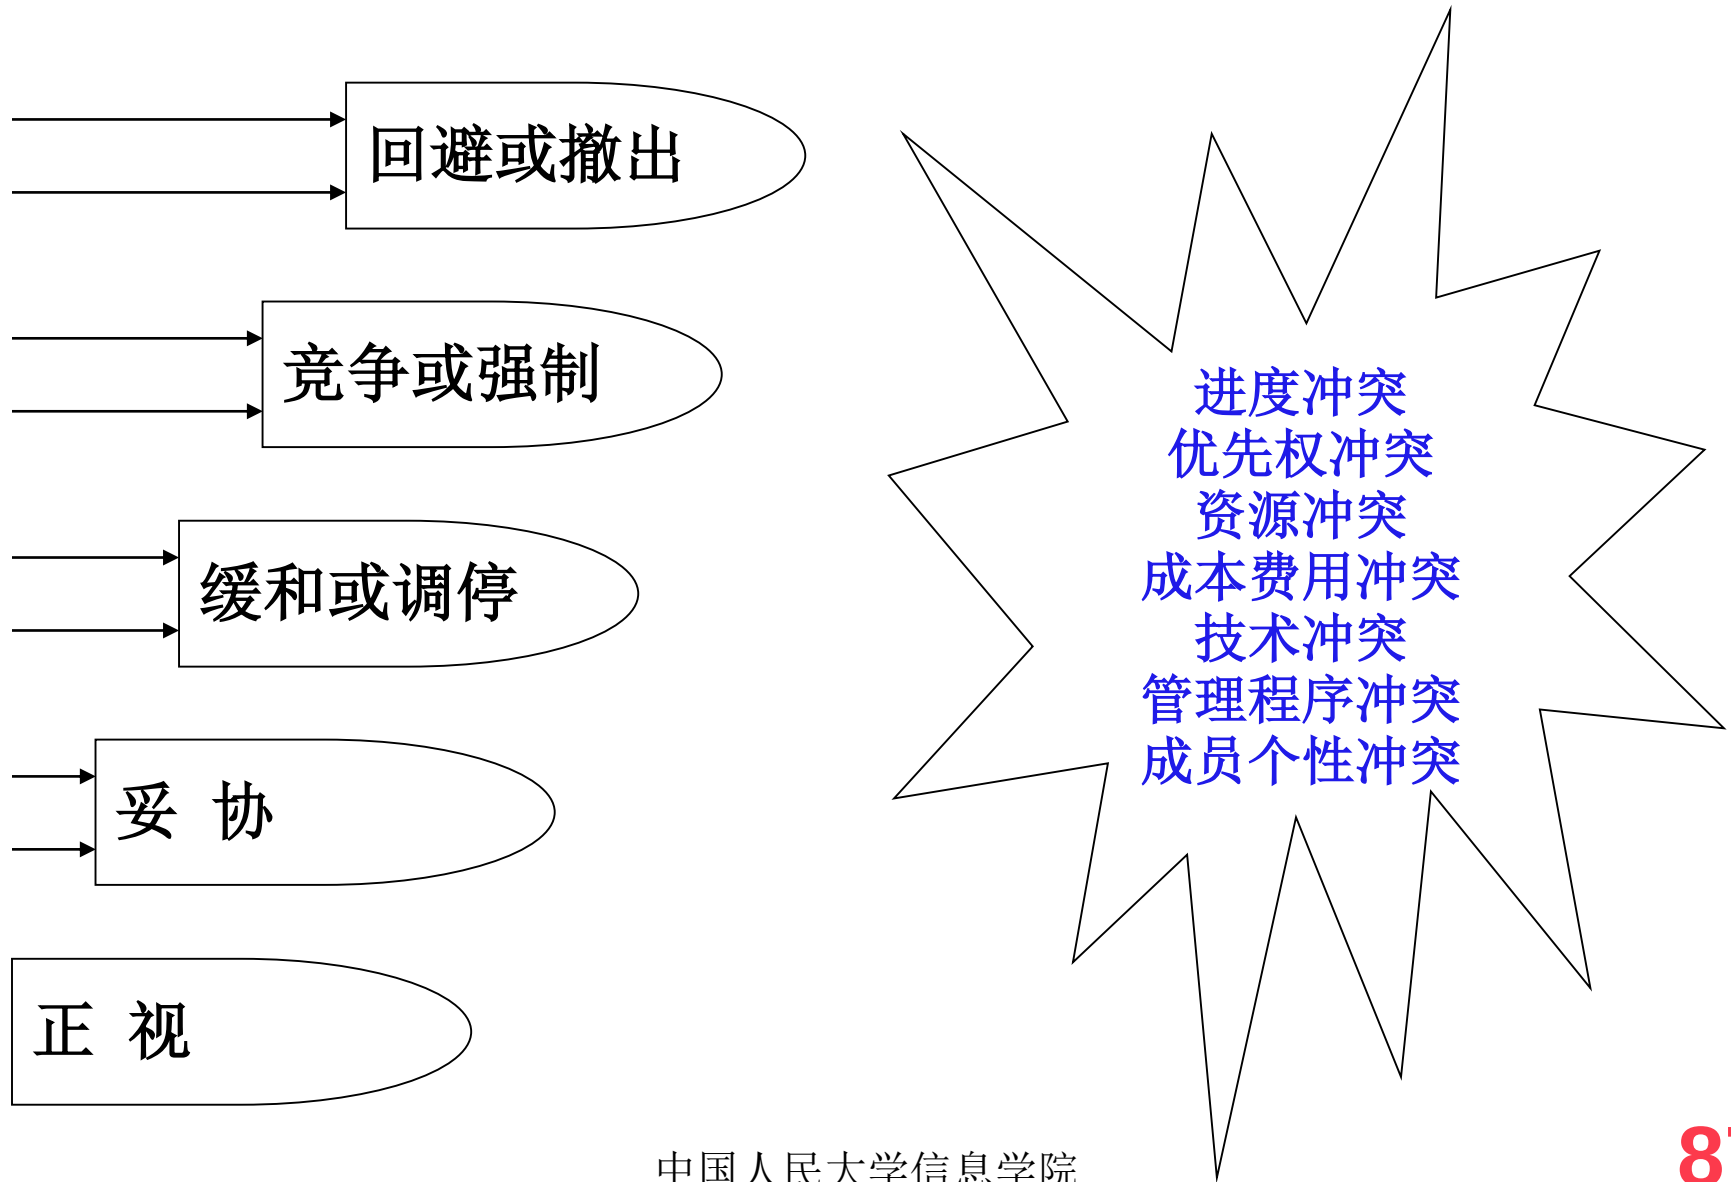

要充分利用和发挥项目团队成员的能力，通过沟通加强团队建设。
